




MUNZUR
ÜNİVERSİTESİ
2008



MUNZUR ÜNİVERSİTESİ

2016 YILI YATIRIM PROGRAMI

İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

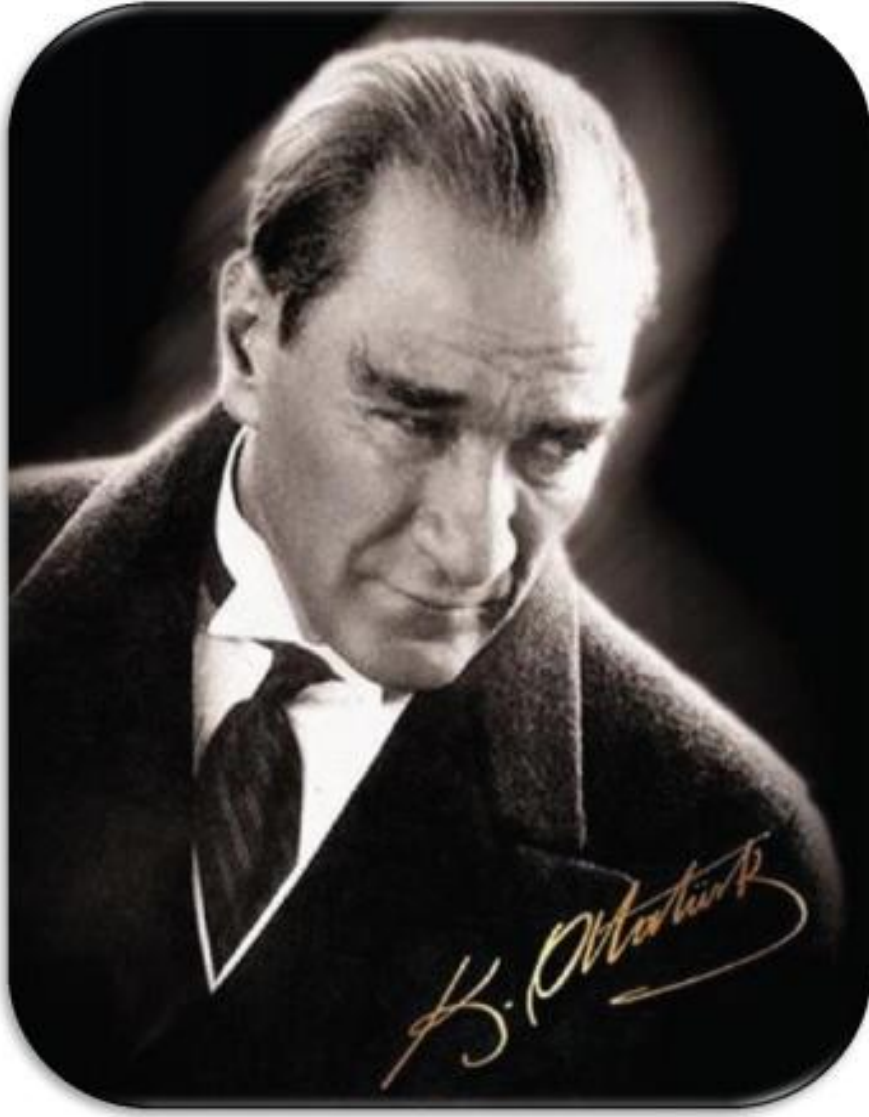

Gençler cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz, almakta olduğumuz terbiye ve irfan ile insanlık ve medeniyetin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli timsali olacaksınız. Yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.

M. Kemal ATATÜRK

İÇİNDEKİLER

1. GENEL DEĞERLENDİRME.....	1
1.1 Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları.....	1
1.2 Kuruluşun Mevcut Hizmet Kapasitesi.....	2
1.3 2016 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen.....	3
1.3.1 Hedeflenen.....	3
1.3.2 Gerçekleşen.....	3
1.4 2016 Yılı Yatırım Uygulamaları.....	4
2. 2016 YILI PROJE UYGULAMALARI.....	4
2.1 Devam Eden Projeler.....	4
2.1.1 Kampüs Altyapısı (DAP).....	4
2.1.2 Derslik ve Merkezi Birimler (DAP).....	7
2.1.3 Lojman ve Sosyal Tesis (DAP).....	7
2.1.4 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri(DAP).....	7
2.1.5 Merkezi Araştırma Laboratuvarı.....	8
2.2 Tamamlanan Projeler.....	9
2.2.1 Tamamlanan Projelerin Listesi.....	9
2.2.2 Proje Tamamlama Raporu.....	10
2.2.2.1 Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi.....	10
2.2.2.2 Muhtelif İşler Projesi.....	11
2.2.2.3 Yayın Alımı Projesi.....	14
3. YATIRIM PROJELERİNİN HAZIRLANMASI, UYGULANMASI VE İZLENİP DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN OLARAK.....	15
4. GERÇEKLEŞME RAPORU.....	16
5. KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLOSU.....	17

2016 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

1. Genel Değerlendirme

Kuruluşumuzun Misyonu

21 Yüzyılda bölgemizin, ülkemizin ve hatta tüm insanlığın çözüm bekleyen önemli problemleri olarak gördüğümüz su, çevre, gıda, enerji, insani ve sosyal sorunlar konularında ulusal ve uluslararası alanda kabul edilebilir çözümler üretmeye yönelik eğitim-öğretim ve Ar-Ge faaliyetleri gerçekleştirerek ve yenilikçi düşünce anlayışına sahip bireyler yetiştirerek bilgi ve teknoloji üreten bir üniversite olmaktır

Kuruluşumuzun Vizyonu

Yenilikçi, dinamik ve katılımcı yapısıyla, bölgemizde eksikliği hissedilen girişimcilik ruhunu canlandırabilecek Ar-Ge faaliyetleriyle, bölgesindeki insani ve sosyal sorunlara çözüm üreten, ülkemizin doğu ve güneydoğu komşularıyla mevcut ilişkileri geliştiren, eğitim-öğretim, araştırma ve geliştirme yapan, yerelde etkin başarıya sahip teknoloji odaklı bir dünya üniversitesi olarak ilerlemektir.

1.1 Kuruluşun Yatırımlarının Finansman Kaynakları:

Üniversitemiz 5018 sayılı Kanun'da (II) Sayılı Özel Bütçeli İdareler Cetvelinin (A) Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri içerisinde sayılmış olup "Özel Bütçe" li bir kurumdur.

Üniversitemiz 2016 yılı yatırım bütçesinin başlangıç ödenekleri toplamı 26.871.000,00 TL olup, yıl içerisinde likit ödenekten eklenen 5.215.000,00 TL ile birlikte yıl sonu ödenek toplamı 32.086.000,00 TL olmuştur. Yılsonu toplam ödeneğin tamamı özel bütçe kaynakları ile karşılanmıştır.

(1.000 TL)

SEKTÖR	PROJE NUMARASI	PROJE ADI	PROGRAM YILI BÜTÇE ÖDENEK VE KAYNAKLARI				
			ÖZEL BÜTÇE		DÜŞÜLEN	EKLENEN	TOPLAM
			HAZİNE	ÖZ GELİR			
EĞİTİM- YÜKSEK ÖĞRETİM	2016H034740	Muhtelif İşler	1.600			1.020	2.620
	2016H034750	Yayın Alımları	300				300
	2016H034730	Çeşitli Ünitelerin Etüt-Projesi	100				100
	2009H032450	Derslikler ve Merkezi Birimler	17.500				17.500
	2009H032460	Lojman ve Sosyal Tesisler	5.000				5.000
	2009H032440	Kampus Altyapısı	500			4.135	4.635
EĞİTİM - BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR	2010H050240	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	1.371				1.371
DKH-SOSYAL - TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA	2010K121410	Merkezi Araştırma Laboratuvarı	500			60	560
TOPLAM			26.871			5.215	32.086

1.2 Kuruluşun Mevcut Hizmet Kapasitesi:

1

Üniversitemiz merkez kampüs alanı Tunceli Merkez Aktuluk Mahallesinde yer almaktadır. Çemişgezek ve Pertek İlçelerinde Meslek Yüksekokulları, Hozat ve Pülümür İlçelerinde Tunceli Meslek Yüksekokuluna bağlı programlar bulunmakta ve eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.

Üniversitemiz merkez kampüs yerleşkesinde; Fen Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Su Ürünleri Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İletişim Fakültesi, Edebiyat Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sağlık Yüksekokulu ve Tunceli Meslek Yüksekokulu eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.

Merkez kampüs içerisinde derslik binaları, kantin ve kafeteryalar, idari birimler binası, rektörlük idari bina, personel lojmanları, sosyal tesis, kapalı spor salonu, ısı merkezi binası, merkezi araştırma laboratuvarı ve merkezi yemekhane bulunmaktadır. Ayrıca Atatürk Mahallesinde personel lojmanları ve rektörlük konutu bulunmaktadır.

2016 Yılı sonu itibariyle Üniversitemizde, 408 akademik personel ve 236 idari personel olmak üzere toplam 644 personel ile hizmet sunulmaktadır.

2016 Yılı sonu itibariyle Üniversitemizde Lisans, Ön Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerinin toplamı 6.978'dir.

BİNA ADI	HİZMET ALANLARI					
	Derslik (m ²)	Laboratuvar (m ²)	İdari (m ²)	Yemekhane (m ²)	Diğer (Depo,Tesis,Hol, Wc,Sığınak,Sistem Odası,Arşiv) (m ²)	Toplam
Aktuluk Kampüsü Mühendislik Fakültesi	3.535	-	1.711	-	5.660	10.906
Aktuluk Kampüsü İngilizce Hazırlık Okulu Binası	3.224	-	259	-	5.287	8.770
Aktuluk Kampüsü Merkezi Eğitim-Öğretim Laboratuvarları	-	3.844	208	-	3.596	7.648
Aktuluk Kampüsü Merkezi Ar-Ge Laboratuvarları	-	5.996	208	-	3.495	9.699
Aktuluk Kampüsü Isı Merkezi Binası			69		1.796	1.865
Aktuluk Kampüsü Rektörlük İdari Bina	-	-	1.287	-	1.800	3.087
Aktuluk Kampüsü İdari Birimler Binası	-	90	2.511	-	2.144	4.745
Aktuluk Kampüsü Gençlik Evi Binası	-	-	30	-	126	156
Hozat Programı	454	100	150	100	785	1.589
Pülümür Programı	140	54	70	195	591	1.050
Pertek M.Y.O.	780		562	150	2.244	3.736
Pertek Cezaevi Binası					2.772	2.772
Ovacık Programı	500				1.181	1.681
Çemişgezek M.Y.O.	421	102	150	100	642	1.415
Mazgirt Küçükbaş Hayvancılık Araştırma Merkezi					750	750
Pertek Küçükbaş Hayvancılık Araştırma Merkezi					750	750
TOPLAM	9.054	10.186	7.215	545	33.619	60.619

YEMEK HANE			
Birimin adı	Adet	Alanı (m ²)	Kapasite (kişi)
Aktuluk Kampüsü Merkezi Yemekhane	1	4.450	616
TOPLAM	1	4.450	616

KANTİN VE KAFETERİYALAR		
Kantin/Kafeteryanın Adı	Adet	Kapalı Alanı (m ²)
Meslek Yüksek Okulu Kantini	1	224
Mühendislik Fakültesi Kantini	1	110
İdari Birimler Binası Kantini	1	45
TOPLAM	3	379

LOJMANLAR		
Lojman Adı	Daire Sayısı	Kapalı Alanı (m ²)
Atatürk Mahallesi Rektörlük Konutu	3	703
Atatürk Mahallesi Arıkanlar Lojman	15	2.230
Atatürk Mahallesi A Blok Lojman	8	1.036
Atatürk Mahallesi B Blok Lojman	8	1.036
Aktuluk A Blok Lojman	8	1.173
Aktuluk B Blok Lojman	8	1.173
Aktuluk C Blok Lojman	8	1.507
Aktuluk D Blok Lojman	8	1.507
TOPLAM	66	10.365

DİĞER SOSYAL ALANLAR			
	Adet	Alan (m ²)	Kapasite (Kişi)
Kapalı Spor Salonu	1	3.306	600
Sosyal Tesis	1	548	100
TOPLAM	2	3.854	700

2016 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı:

1.2.1 Kuruluşun Yatırımlarıyla Hedeflenen:

- 1- Merkezi Kütüphanede eksik bulunan kitap, dergi vb. yayınların tamamlanması,
- 2- Merkezi Araştırma Laboratuvarına eksik bulunan cihazların alımının yapılması,
- 3- 2016 Yılı sonuna kadar üniversitemizin Aktuluk Yerleşkesinin birleştirilen Etap yapılarının ihale edilmesi
- 4- 2016 Yılı sonuna kadar üniversitemizin Aktuluk Yerleşkesinin peyzaj ve çevre düzenlemesinin tamamlanması.
- 5- 2016 Yılı sonuna kadar üniversitemizin Aktuluk Yerleşkesinin çevre sulama sisteminin tamamlanması.
- 6- Mekânların kalite ve konforunu arttırılması,
- 7- Yapıların tasarım ve projelerinde yeşil alanların ağırlıklı olmasını sağlanması,
- 8- Üniversitemizin yazılım ve donanım alanında güncellemelerin yapılması,
- 9- Üniversitemizin yazılım ve donanım alanında eksiklerin tamamlanması,
- 10- Üniversitemizin büro ve işyeri mefruşat, makine, teçhizat ve taşıt alımının yapılması,

1.2.2 Kuruluşun Yatırımlarıyla Gerçekleşen:

- 1- Merkezi Kütüphanede eksik olan kitap, dergi vb. yayınlar büyük bir oranda tamamlanmıştır.
- 2- Merkezi Araştırma Laboratuvarında eksik bulunan cihazların alımı yapıldı.
- 3- Aktuluk yerleşkesi 1 Etap Peyzaj ve Çevre Düzenlenmesi Yapım İşi %90 oranında tamamlandı.
- 4- Aktuluk Yerleşkesinin çevre sulama sistemi %90 oranında tamamlandı.
- 5- Aktuluk yerleşkesinde ağaçlandırma binalar arasında bitkilendirme yapılmıştır.
- 6- Öğrenci parkında yürüyüş yolları, oturma alanları aydınlatma çalışmaları yürütülmüştür.
- 7- Merkez ve İlçelerde bulunan binaların bakım onarımı yapılarak binaların kalite ve konforu arttırılmıştır.
- 8- ARGE laboratuvar binasında bulunan laboratuvar salonları derslik ve ofislere dönüştürüldü.
- 9- Üniversitemiz Personel Otomasyonu, Elektronik Belge Yönetim Sistemi ve Öğrenci İşleri Otomasyonu bakım destek ve güncelleme hizmeti yapılmıştır.
- 10- Üniversitemizde kullanılmak üzere SPSS İstatistik ve Analiz Programı, Matlab Programı ve BAP Otomasyon Programı alınmıştır.
- 11- Üniversitemizin büro ve işyeri mefruşat, makine, teçhizat ve taşıt alımları yapılmıştır.

1.3 2016 Yılı Yatırım Uygulamaları:

3

Üniversitemize 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile yatırım harcamaları için toplam 26.871.000,00 TL kaynak tahsis edilmiştir. Ayrıca ihtiyaca binaen Üniversitemiz yatırım harcamaları için likit karşılığı olmak üzere 5.215.000,00 TL ödenek ekleme yapılmıştır. Yatırım harcamaları için gerçekleşen toplam 32.086.000,00 TL ödeneğin 5.568.513,11 TL'si harcanmıştır. Buna göre harcamanın yılsonu ödeneğine göre gerçekleştirme oranı olan gider gerçekleşmesi %17,35 olarak tespit edilmiştir.

Üniversitemiz kamu yatırımları kapsamında yapılan harcamaların türü, giderin ekonomik sınıflandırmasının ikinci düzeyi ile aşağıda gösterilmiştir.

2. Düzey Ekonomik Kod	Açıklama	K.B.Ö.	Eklenen	Düşülen	Yıl Sonu Ödenek Toplamı	Harcama	Gerçekleşme Oranı (%)
06.1	Mamul Mal Alımları	2.200.000,00	260.000,00	0,00	2.460.000,00	1.481.660,79	60,23
06.3	Gayri Maddi Hak Alımları	200.000,00	210.000,00	0,00	410.000,00	408.992,03	99,75
06.5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	24.471.000,00	4.135.000,00	0,00	28.606.000,00	3.311.532,39	11,58
06.7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	0,00	610.000,00	0,00	610.000,00	366.327,90	60,05
TOPLAM		26.871.000,00	5.215.000,00	0,00	32.086.000,00	5.568.513,11	17,35

2. 2016 Yılı Proje Uygulamaları

2.1. Devam Eden Projeler

2.1.1 Kampüs Altyapısı (DAP)

Proje Adı	Proje Ödeneği	Eklenen	Düşülen	Toplam Ödenek	Harcama	Program Ödeneğinin Değerinden Sapması (%)	Nakdi Gerçekleşme Oranı (%)
2009H032440	500.000,00	4.135.000,00	0,00	4.635.000,00	3.311.532,39	927	11,58

- İhale Tarihi: 17.08.2015
- İhale Bedeli: 3.430.000,00TL
- Yer Teslim Tarihi: 15.09.2015
- Sözleşmesine Göre İş Bitim Tarih:31.10.2016
- 2016 Yılında Ödenen Toplam Bedel: 3.311.532,39 (Fiyat Farkı ve KDV dahil)

Aktuluk yerleşkesi 1 Etap Peyzaj ve Çevre Düzenlenmesi Yapım İşi kapsamında ağaçlandırma çalışmaları yollar, kaldırımlar, gereken yerlerde taş duvarlar kampüs alanı içerisinde bulunan binalar arasında bitkilendirme ve otomatik sulama işlemlerinin uygulaması yapılmıştır. Öğrenci parkında yürüyüş yolları, oturma alanları bitkilendirme, ağaçlandırma ve bunlara bağlı olarak sulama ve aydınlatma çalışmaları yürütülmüştür. Ayrıca idari birimler yanında yapılan parkta yürüyüş yolları,

oturma alanları bitkilendirme, ağaçlandırma ve bunlara bağı olarak sulama ve aydınlatma çalışmaları yürütölmüştür.

4



Geo Duvar Yapım İşı



İdari Birimler Binası Park Alanı Yapımı



Peyzaj Alanında Kullanılan Bitkiler



Peyzaj Otomatik Sulama Hattı Boru ve Hidroforları



Özgür Öğrenci Parkı Yeniden Yapılandırılması

2.1.2 Derslik ve Merkezi Birimler (DAP)

<i>Proje Adı</i>	<i>Proje Ödeneği</i>	<i>Eklenen</i>	<i>Düşülen</i>	<i>Toplam Ödenek</i>	<i>Harcama</i>	<i>Program Ödeneğinin Değerinden Sapması (%)</i>	<i>Nakdi Gerçekleşme Oranı (%)</i>
2009H032450	17.500.000,00	0,00	0,00	17.500.000,00	0,00	0	0

2016 yılı içerisinde Üniversitemizin II.Etap inşaatı için Derslik ve Merkezi Birimler (DAP) projesi kapsamında verilen ödenek ile Edebiyat Fak. (9565m²), İ.İ.B.Fak.(11.016 m²), T.M.Y.O.(11.016 m²), Sağ.Yük. (11.016 m²), Mer. Küt.(5.845 m²), Kongre ve Kül.Mrk. (4.827 m²), Mrk.Dek.Bin. (6.205 m²), Mis.Bin. (4.015 m²), Gar. Bin.(1.779 m²), Anaokulu ve Kreş Bin. (1.010 m²) yapılması hedeflenmiş. Öngörülemeyen nedenlerle 2016 yılı içerisinde Üniversitemizin inşaatına başlanmamış olup bu sektörde herhangi bir harcama yapılmamıştır. 2017 yılı içerisinde TOKİ tarafından ihale süreçleri tamamlanıp Üniversitemizin Derslik ve Merkezi Birimler (DAP) Projesi kapsamında yapılacak hizmet binalarının inşaatına başlanacaktır.

2.1.3 Lojman ve Sosyal Tesis (DAP)

<i>Proje Adı</i>	<i>Proje Ödeneği</i>	<i>Eklenen</i>	<i>Düşülen</i>	<i>Toplam Ödenek</i>	<i>Harcama</i>	<i>Program Ödeneğinin Değerinden Sapması (%)</i>	<i>Nakdi Gerçekleşme Oranı (%)</i>
2009H032460	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0	0

2016 yılı içerisinde Üniversitemizin II.Etap inşaatı için Lojman ve Sosyal Tesis (DAP) Projesi kapsamında verilen ödenek ile 128 adet lojman yapılması hedeflenmiş. Öngörülemeyen nedenlerle 2016 yılı içerisinde Üniversitemizin inşaatına başlanmamış olup bu sektörde herhangi bir harcama yapılmamıştır. 2017 yılı içerisinde TOKİ tarafından ihale süreçleri tamamlanıp Üniversitemizin Lojman ve Sosyal Tesis (DAP) Projesi kapsamında yapılacak olan personel lojmanları inşaatına başlanacaktır.

2.1.4 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri(DAP)

<i>Proje Adı</i>	<i>Proje Ödeneği</i>	<i>Eklenen</i>	<i>Düşülen</i>	<i>Toplam Ödenek</i>	<i>Harcama</i>	<i>Program Ödeneğinin Değerinden Sapması (%)</i>	<i>Nakdi Gerçekleşme Oranı (%)</i>
2010H050240	1.371.000,00	0,00	0,00	1.371.000,00	0,00	0	0

2016 yılı içerisinde Üniversitemizin II.Etap inşaatı için Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (DAP) Projesi kapsamında verilen ödenek ile yarı olimpik kapalı yüzme havuzu (1.960 m²) yapılması hedeflenmiş. Öngörülemeyen nedenlerle 2016 yılı içerisinde Üniversitemizin inşaatına başlanmamış olup bu sektörde herhangi bir harcama yapılmamıştır. 2017 yılı içerisinde TOKİ tarafından ihale süreçleri tamamlanıp Üniversitemizin Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (DAP) Projesi kapsamında yapılacak olan yarı olimpik kapalı yüzme havuzu inşaatına başlanacaktır.

2.1.5 Merkezi Araştırma Laboratuvarı

<i>Proje Adı</i>	<i>Proje Ödeneği</i>	<i>Eklenen</i>	<i>Düşülen</i>	<i>Toplam Ödenek</i>	<i>Harcama</i>	<i>Program Ödeneğinin Değerinden Sapması (%)</i>	<i>Nakdi Gerçekleşme Oranı (%)</i>
2010K121410	500.000,00	60.000,00	0,00	560.000,00	560.000	12	100

Üniversitemizin personel ve öğrencilerinin Arge faaliyetlerinde kullanılmak üzere Merkezi Araştırma Laboratuvar Merkezinde kullanılmak üzere laboratuvar cihaz alımları yapılmıştır.



SEM (Scanning Electron Mikroskop) cihazı



Saha Tipi Su Kalitesi Ölçüm Cihazı



Manuel SPME Sistemi



Yatay tüp ısı işlem ve sinterleme fırını



Ultrasonic Homojenizer



Otomatik Viskozimetre (Probu)



Kamara Tip Laboratuvar Fırını



Termal İletkenlik Eğitim Seti



İnsan Eğitim Maketi



Termal Cycler (Termal Döngüleyici)

2.2. Tamamlanan Projeler

2.2.1. Tamamlanan Projeler Listesi

1. Proje No : 2016H034730
Proje Adı : Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi (DAP)
Proje Sahibi : Tunceli Üniversitesi
Proje Yürütücüsü : Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
2. Proje No : 2016H034740
Proje Adı : Muhtelif İşler Projesi (DAP)
Proje Sahibi : Tunceli Üniversitesi
Proje Yürütücüsü : Bilgi İşlem Daire Başkanlığı – İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı -Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
3. Proje No : 2016H034750
Proje Adı : Yayın Alımı Projesi (DAP)
Proje Sahibi : Tunceli Üniversitesi
Proje Yürütücüsü : Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

2.2.2. Proje Tamamlama Raporu

PROJE TAMAMLAMA RAPORU

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2016H034730					
Proje Adı	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi (DAP)					
Sektör/Alt sektör	Eğitim - Yüksek Öğretim					
Proje Amacı						
Proje Yeri	Tunceli					
Karakteristiği	Etüt Proje					
Fiziki Hedefi						
Başlama-Bitiş Tarihi	2016 - 2016					
Proje Sözleşmesi Tarihi				Sözleşme İhale Bedeli		
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
		100.000,00				
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	Cari Fiyatlarla			2016 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
Programa Alındığı Yıl (2016)		0				
Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projenin Çıktısı/Sonucu (Ürünü)						
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	Üniversitemize bağlı Çemişgezek Meslek Yüksek Okulu yerleşke alanının oluşturulması için avan ve uygulama projelerinin yapılması planlanmaktadır					
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı						
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü						
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler						

(*) Kamulaştırma Hariç

(**) 2016 – 2018 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi Tablo-13' de yer alan Kamu Sabit Sermaye Yatırım ve Dış Para Deflatörleri Tablosundan faydalanılacaktır. Cari yıl fiyatlarıyla olan harcamalar ilgili yılın deflatörüne bölünerek 2016 yılı fiyatlarına dönüştürülecektir.

(***) Parasal değerler Bin TL. olarak verilecektir.

PROJE TAMAMLAMA RAPORU

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2016H034740					
Proje Adı	Muhtelif İşler (DAP)					
Sektör/Alt sektör	Eğitim - Yüksek Öğretim					
Proje Amacı						
Proje Yeri	Tunceli					
Karakteristiği	Makine-Teçhizat, T-2(1 Adet)					
Fiziki Hedefi						
Başlama-Bitiş Tarihi	2016 - 2016					
Proje Sözleşmesi Tarihi			Sözleşme Bedeli	İhale		
Proje Tutarı (Maliyeti)	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
		1.100.000,00				
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	Cari Fiyatlarla			2016 Yılı Fiyatlarıyla		
	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
<i>Programa Alındığı Yıl (2016)</i>		341.237,46				
Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projenin Çıktısı/Sonucu (Ürünü)	Üniversitemiz akademik ve idari birimlerinde kullanılmak üzere Bilgisayar 5 adet, Büro Makinesi (çok fonksiyonlu yazıcı 15 adet, fotokopi makinesi 1 adet, televizyon 1 adet, evrak imha makinesi 6 adet, telefon makinesi 50 adet, projeksiyon cihazı 10 adet, klima 7 adet, Büro Mefruşatı (makam misafir koltuğu 4 adet) alımları yapılmıştır. Yine Üniversitemiz hizmetinde kullanılmak üzere Taşıt Alımı (Binek Otomobil 1 adet) Güvenlik ve Kontrol Amaçlı X-Ray Bagaj Kontrol Sistemi, Kapı Detektörü, Araç Geçiş Sistemi ve Park Bahçe Mefruşatı alımları yapılmıştır.					
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	Proje kapsamında yapılan harcamalar neticesinde Üniversitemiz akademik ve idari birimlerinin talepleri karşılanarak sunulan hizmet kalitesi artırılmıştır.					
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı	2013-2017 Stratejik Planında yer alan Hedefler doğrultusunda etkin, verimli ve güvenli hizmet sunulabilmesi için gerekli fiziki şartların oluşturulması hedeflenmiş olup bu performansa yönelik faaliyetleri gerçekleştirmiştir.					
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü	Bürokrasinin fazla ve sık değişken olması projelerin uygulanmasında aksaklıklara neden olmaktadır. Proje hazırlama, uygulama, izleme, değerlendirme birimlerindeki personelin nitelik ve sayısı yetersizdir. Kısıtlı zamana karşı özverili çalışma ile çözümlenmiştir.					
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler	Gelecek yıllara ait bütçe çalışmalarında yatırım programı hazırlanırken ihtiyaçların titizlikle belirlenmesi ve İhale süreci uzun olduğu için, yapılması planlanan işler bütçe yılı başında tespit edilmelidir.					

(*) Kamulaştırma Hariç

(**) 2016 – 2018 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi Tablo-13' de yer alan Kamu Sabit Sermaye Yatırım ve Dış Para Deflatörleri Tablosundan faydalanılacaktır. Cari yıl fiyatlarıyla olan harcamalar ilgili yılın deflatörüne bölünerek 2016 yılı fiyatlarına dönüştürülecektir.

(***) Parasal değerler Bin TL. olarak verilecektir.

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2016H034740			2016H034740		
Proje Adı	Muhtelif işler Projesi			Muhtelif işler Projesi		
Sektör/Altsektör	Eğitim			Eğitim		
Proje Amacı	Eğitim ve Öğretimi geliştirme			Eğitim ve Öğretimi geliştirme		
Proje Yeri	Tunceli Merkez			Tunceli Merkez		
Karakteristiği	Bilgi ve İletişim Teknolojileri			Bilgi ve İletişim Teknolojileri		
Fiziki Hedefi						
Başlama-Bitiş Tarihi	2016-2016			2016-2016		
Proje Sözleşmesi Tarihi			Sözleşme İhale Bedeli			
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
		500.000,00			910.000,00	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	Cari Fiyatlarla			2016 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
Programa Alındığı Yıl (2016)		807.792,21				
Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projenin Çıktısı/Sonucu (Ürünü)	Üniversitemizin yazılım ve donanım alanında çeşitli eksiklerin giderilmesi ve Üniversitemizin hizmet kalitesinin artırılması için bilgisayar, yazılım vb. ürünler alınmıştır.					
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	Proje kapsamında yapılan harcamalar neticesinde Üniversitemizin eğitim ve araştırma hizmetlerine yönelik olarak bilgisayar hizmeti en üst düzeye getirilmiş, kampüs ve ilçelerde iletişim alt yapısını oluşturulmuş, üniversitemizin hizmetlerine ve kullanıcılarına bilgisayar, yazılım ve kullanım desteği verilmiş, öğrencilere ve tüm akademik ve idari personele bilgisayar kullanım olanağı sağlanmıştır. Network alt yapısının yenilenmesi sayesinde internetin hızı artırılarak Personellerimizin iş ve işlemlerinin daha hızlı yapmaları sağlanarak zamandan tasarruf etmeleri sağlanmış, aynı zamanda çağdaş yaşanabilir yerleşke olmak için, bilgi ve iletişim hizmetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi ile eğitim ve hizmet kalitesi artırılmıştır.					
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı	Üniversitemizin 2013-2017 Stratejik Planında yer alan Hedefler doğrultusunda etkin, verimli ve güvenli hizmet sunulabilmesi için gerekli fiziki şartların oluşturulması hedeflenmiş olup bu performansa yönelik faaliyetleri gerçekleştirmiştir.					
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü	Bilgi teknolojilerine tahsis edilen ödenekler yetersizdir. Yıllık bütçe artışları, piyasada ki fiyat artışları yanında yetersiz kalmakta ve reel olarak azalmaktadır. Her yeni yılbaşında ödeneklerin serbest bırakılması, belli yüzdelere bağlanmakta, en çok ihtiyaç duyulan çeşitli giderler için asgari % 20 serbesti gereken kalemlerde serbest bırakılan ödenekler çok cüzi oranlardadır ve ihtiyacı karşılamaktan çok uzaktır. Bilgi teknolojilerine (Bilgisayar ve Yazılımlar) tahsis edilen ödeneklerde aynı şekilde yeni açılan Fakülte, Meslek Yüksekokul ve bölümlerin ihtiyacını karşılamadığı gibi mevcut Bilgi teknolojilerinin (Bilgisayar ve Yazılımlar) modernize edilmesi için de çok yetersizdir. Çalışanların özlük hakları yetersizdir. Personeli motive edecek gerekli sosyal, kültürel ve sportif aktiviteler yoktur. Personelin yeni mevzuatı ancak kendi çabasıyla öğrenmeye çalışması, yapılan hizmet ve iş taleplerinin, kişisel ölçülerde değerlendirilmesi ve mevzuata uygunluğu talep edenlerce göz ardı edilmektedir. Çok yıllık projelerin yıllık ödeneğinin talep edilenden düşük olarak tahsis edilmesi yatırımların tamamlama sürecinin uzamasına ve yatırım maliyetlerinin her geçen yıl artmasına neden olmaktadır. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunundaki yasal bekleme süreçleri ihalelerin çok geç sonuçlanmasına neden olmakta ve bu durum ise hedeflerin gerçekleşmesi sürecini geciktirmektedir. Proje hazırlama, uygulama, izleme, değerlendirme birimlerindeki personelin nitelik ve sayısı yetersizdir. Halen deneyimli personel sayımız azınlıkta olup Bilgisayar Mühendisi açığımız bulunmaktadır. Bürokrasinin fazla ve sık değişken olması projelerin uygulanmasında aksaklıklara neden olmaktadır. Yine Başkanlığımız içerisindeki hizmet alanları farklı konular olduğundan, birimler arası rotasyonun uygulanamaması önemli sorunlarda bir tanesidir. Gelecek yıllara ait bütçe çalışmalarında bilgi teknolojileri (Bilgisayar ve Yazılımlar) alımları ödeneklerinin artırılması, harcama programı yapılırken dönemlere ait ihtiyaçların belirlenerek ihtiyaç miktarı ödeneklerin serbest bırakılması, Personelin özlük haklarının iyileştirilmesi, binlerce sayfadan oluşan mevzuatın, her kesin anlayabileceği şekilde az ve öz olarak düzenlenmesi gerekmektedir. Nasıl çözümlendiği; Kısıtlı zamana karşı özverili çalışma ile çözümlenmiştir.					
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler	Gelecek yıllara ait bütçe çalışmalarında bilgi teknolojileri (Bilgisayar ve Yazılımlar) alımları ödeneklerinin artırılması, yatırım programı yapılırken dönemlere ait ihtiyaçların belirlenerek ihtiyaç miktarı ödeneklerin serbest bırakılması, Personelin özlük haklarının iyileştirilmesi, binlerce sayfadan oluşan mevzuatın, her kesin anlayabileceği şekilde az ve öz olarak düzenlenmesi gerekmekte, İhale süreci uzun olduğu için, yapılması planlanan işler bütçe yılı başında tespit edilmelidir.					

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2016H034740			2016H034740		
Proje Adı	Muhtelif İşler Projesi (DAP)			Muhtelif İşler Projesi (DAP)		
Sektör/Altsektör	Eğitim - Yüksek Öğretim			Eğitim - Yüksek Öğretim		
Proje Amacı	Eğitime Destek Amacıyla Büyük Bakım Onarımların Yapılması			Eğitime Destek Amacıyla Büyük Bakım Onarımların Yapılması		
Proje Yeri	Tunceli			Tunceli		
Karakteristiği	Büyük Bakım Onarım			Büyük Bakım Onarım		
Fiziki Hedefi						
Başlama-Bitiş Tarihi	2016 - 2016			2016-2016		
Proje Sözleşmesi Tarihi				Sözleşme İhale Bedeli		
Proje Tutarı (Maliyeti)	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
		0,00			610.000,00	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	Cari Fiyatlarla			2016 Yılı Fiyatlarıyla		
	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
<i>Programa Alındığı Yıl (2016)</i>		366.327,90				
Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projenin Çıktısı/Sonucu (Ürünü)	Üniversitemizin mevcut kullanılan hizmet binalarının bakım onarım ve güçlendirmeleri yapılarak modernize edilmesi, artan öğrenci sayımıza paralel olarak derslik ve laboratuvar ihtiyaçlarının karşılanması ve Üniversitemize ilçe programları için tahsis edilen kamu binalarının eğitim öğretim faaliyetlerine uygun hale getirilmesi ve Üniversitemiz öğrencilerinin ve akademik elemanlarının çalışma ve araştırmalarını en iyi şekilde yürütebilmesi sağlanacaktır.					
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	Üniversitemizin Merkez ve İlçelerde bulunan binaların bakım onarımı yapılarak ARGE laboratuvar binasında bulunan laboratuvar salonları derslik ve ofislere dönüştürüldü. Fakülte, Meslek Yüksekokulları ve Araştırma merkezleri ile Daire Başkanlıklarından gelen talepler doğrultusunda binalarda ihtiyaç duyulan bakım onarım işleri yapıldı.					
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı						
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü	Tunceli ilinin bölgesel koşulları değerlendirildiğinde, inşaat imalatlarına ait yenilikler ve kapsamlı araştırma olanaklarının kısıtlı olması bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Nasıl çözümlendiği; Kısıtlı zamana karşı özverili çalışma ile çözümlenmiştir.					
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler	Gerçekleşecek olan inşaat imalatları ve yatırım programlarına idari birimlerin yanı sıra akademik kadrolarında sorun çözücü ve aktif rol almasının olanakların geliştirileceği düşünülmektedir.					

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2016H034750					
Proje Adı	Yayın Alımı Projesi (DAP)					
Sektör/Altsektör	Eğitim - Yüksek Öğretim					
Proje Amacı	Eğitim-öğretim ve akademik çalışmaları desteklemek					
Proje Yeri	Tunceli					
Karakteristiği	Basılı Yayın ve Elektronik Yayın Alımı					
Fiziki Hedefi						
Başlama-Bitiş Tarihi	2016 - 2016					
Proje Sözleşmesi Tarihi			Sözleşme İhale Bedeli			
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
		300.000,00				
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	Cari Fiyatlarla			2016 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
Programa Alındığı Yıl (2016)		181.623,26				
Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projenin Çıktısı/Sonucu (Ürünü)	Akademik Çalışmalar Kullanım Ölçümleri, istatistikler					
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	Merkezi kütüphanede günümüz koşullarına cevap veren teknolojik ve teknik altyapının sağlanmasıyla eğitim-öğretim ve kültürel faaliyetlerin etkin bir biçimde sürdürülmesi amaçlanmıştır. Merkezi Kütüphanemizin eksikleri giderilerek öğrencilerimizin, akademik ve idari personelimizin araştırmalarında kullanacağı zengin bir kaynak haline gelmiş ve verimli çalışmalar yapılmıştır.					
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı	Birebir ilişkili olup, optimum beklenen katkı gerçekleşmiştir.					
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü	Üniversitemizde 6.937 öğrenci ve 2.938 kütüphane üyesine hizmet verilmiştir. Farkındalık açısından 52.Kütüphane haftası kutlanmıştır. Üniversitemiz yayını yazarı ile beraber basın tanıtılmıştır. Öğrenci ve kullanıcılara oryantasyon eğitimi verilmiştir. Toplam 12 adet Veri tabanı ile hizmet verilmiştir 541 yeni ve talep edilen basılı kitap alınmıştır. Kütüphane ve bilgi teknolojileri ile ilgili olarak 5 adet çalıştay, eğitim ve toplantıya katılım sağlanmıştır. Kullanıcılar tarafından talep edilen ve envanterimizde olmayan 35 talep diğer kütüphanelerinden KİTS aracılığı ile karşılanmıştır. Süreli yayınlar salonu oluşturulmuştur Okuma salonuna merhum öğrencimiz Erkan SARİCE'nin ismi Rektörlük Makamı ile birlikte törenle verilmiş ve açılışı yapılmıştır. İdari ve mali iş ve işlemler yürütülmüştür. SORUNLAR: -Bilgisayar ve internet erişim sorunu -Bilgisayar mühendisi/görevlisi olarak personel eksikliği Kütüphane binasının olmayışı ÇÖZÜM ÖNERİLERİ: -Liyakatli ve nitelikli personel temini - Kütüphane binasının yapılması ile çözülür					
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler	Liyakat, kalite, standartlar ve nitelikli işgücünün elzem ve zorunlu olduğu bir kez daha kanıtlanmıştır					

3. Yatırım Projelerinin Hazırlanması, Uygulanması ve İzlenip Değerlendirilmesine İlişkin Olarak;

- Bölgenin düşük gelir düzeyi, işsizlik oranı ve ulaşım olanaklarının zorluğu nedeniyle Üniversiteye düşen yükün artmasından dolayı Kamu kaynağı dağılımında ayrıcalıklı ödenek verilmesi,
- Fiziki yapısını tamamlayamamış olan üniversitelerin, yatırım bütçe tekliflerindeki taleplerinin mümkün olduğunca karşılanması,
- Üniversitemizin ihtiyaçlarını karşılayacak sayıda eğitimli, teknik ve idari personel için kadro tahsisi yapılması,
- Üniversiteler arasında uyum birliğinin sağlanması için idari ve teknik personelin periyodik olarak hizmet içi eğitime tabi tutulması,
- 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda öngörülen sürelerin kısaltılması yönünde yasal düzenleme yapılması,
- Ayrıntılı Finansman Programının hazırlanmasında yatırım ödeneklerinin serbest bırakma oranları ile ilgili Üniversitemiz tekliflerinin dikkate alınması,
- Yıl içerisinde yeni projelerin programa alınması ve proje parametrelerinde değişiklik yapılması gibi taleplerin kurumlar arası bürokratik işlemlerinin azaltılması ve taleplerin kısa sürede karşılanması.

Yukarıdaki önerilerin, yatırımcı kuruluşlar ve yatırımların sonuçlanması için önemli olduğu düşünülmektedir.

Kuruluş Adı : MUNZUR ÜNİVERSİTESİ**2016 YILI HARCAMALARI DÖNEM GERÇEKLEŞME RAPORU****Sektör Adı : Eğitim****2016 4.Dönem Sonu Yıl İçi Kümülatif Nakdi**

(BİN TL)

Bim No (1)	YSK (2)	Proje No (3)	Proje Adı (4)	Bütçe Türü (5)	Bitiş Yılı (6)	Yeri (7)	Proje Tut. Dış (8)	Proje Tut. Toplam(9)	2015 Kümülatif Harcama (10)	Ödenek Dış Kredi (11)	Ödenek Dış Özkaynak(12)	Ödenek Toplam (13)	+ / - (14)	Aktarma Mikt.(15)	Harcama Dış Kredi (16)	Harcama Dış Özkaynak (17)	Harcama Toplam (18)
266641	422,	2009H032440	Kampüs Altyapısı(DAP)	ÖZEL BÜTÇE	2018	Tunceli	0,	60.000,	44.367,	0,	0,	4.635,					3.312,
268390	422,	2009H032450	Derslik ve Merkezi Birimler (DAP)	ÖZEL BÜTÇE	2018	Tunceli	0,	101.000,	45.011,	0,	0,	17.500,					
268393	422,	2009H032460	Lojman ve Sosyal Tesis (DAP)	ÖZEL BÜTÇE	2018	Tunceli	0,	16.000,	5.370,	0,	0,	5.000,					
250112	422,	2010H050240	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri(DAP)	ÖZEL BÜTÇE	2018	Tunceli	0,	4.100,	2.206,	0,	0,	1.371,					
249992	422,	2016H034730	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi(DAP)	ÖZEL BÜTÇE	2016	Tunceli	0,	100,	0,	0,	0,	100,					
250037	422,	2016H034740	Muhtelif İşler(DAP)	ÖZEL BÜTÇE	2016	Tunceli	0,	1.600,	0,	0,	0,	2.610,	+	10			1.515,
250049	422,	2016H034750	Yayın Alımı(DAP)	ÖZEL BÜTÇE	2016	Tunceli	0,	300,	0,	0,	0,	300,					182,
TOPLAM							0,	183.100,	91.801,	0,	0,	31.516,		10			5.009,

Sektör Adı : DKH**2016 4.Dönem Sonu Yıl İçi Kümülatif Nakdi**

Bim No (1)	YSK (2)	Proje No (3)	Proje Adı (4)	Bütçe Türü (5)	Bitiş Yılı (6)	Yeri (7)	Proje Tut. Dış (8)	Proje Tut. Toplam(9)	2015 Kümülatif Harcama (10)	Ödenek Dış Kredi (11)	Ödenek Dış Özkaynak(12)	Ödenek Toplam (13)	+ / - (14)	Aktarma Mikt.(15)	Harcama Dış Kredi (16)	Harcama Dış Özkaynak (17)	Harcama Toplam (18)
252132	422,	2010K121410	Merkezi Araştırma Laboratuvarı	ÖZEL BÜTÇE	2016	Tunceli	0,	8.196,	7.696,	0,	0,	560,					560,
TOPLAM							0,	8.196,	7.696,	0,	0,	560,		0,			560,

2016 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLOSU (*)

Kurum Adı: Munzur Üniversitesi

Bütçe Türü: Özel Bütçe

2016 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2015 Sonu Kümülatif Harcama			2015 Yılı Program Ödenek			2016 Yılı Revize Ödenek			2016 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak	
Tarım															
Madencilik															
İmalat															
Enerji															
Ulaştırma-Hab.															
Turizm															
Konut															
Eğitim	7		183.100			91.801			31.516			31.526			5.009
Sağlık															
D.Kamu Hizm.	1		8.196			7.696			560			560			560
-İktisadi															
-Sosyal	1		8.196			7.696			560			560			560
TOPLAM	8		191.296			99.497		0	32.076			32.086			5.569

(*) Genel Bütçe, Özel Bütçe, KİT, Özelleştirme Kaps. Kur., Döner Sermaye, Mahalli Katkı, Fon, Hibe vs. gibi birden fazla farklı kaynaktan finansman sağlayarak yatırım yürüten kuruluşlar, bu tabloyu toplam yatırımlar ve her bir bütçe türü itibarıyla ayrı ayrı hazırlayacaklardır.
